

東郷元帥記念公園の改修整備について

1 工事再開について

東郷元帥記念公園改修工事は、平成29年10月に工事着手しましたが、公園区域内から国が定める土壌含有量基準を超える「鉛」が検出されたことにより、工事を一時中止していました。


この度、「東郷元帥記念公園改修整備検討協議会」において、基準超過土壌に対する対策や、現況樹木の取扱い等についてご意見を伺い、区として方針を決定しましたので、下段部の土壌対策等の工事について令和2年4月16日に再開いたしました。

2 今後のスケジュール

「東郷元帥記念公園改修整備検討協議会」にて引き続き整備案について検討を行い、決定次第契約変更の手続きをします。

工事については、下段部の土壌対策工事に引き続き下段部の整備工事を行います。

下段部が完成し、開放した後、上・中段部の土壌対策工事及び整備工事を実施してまいります。

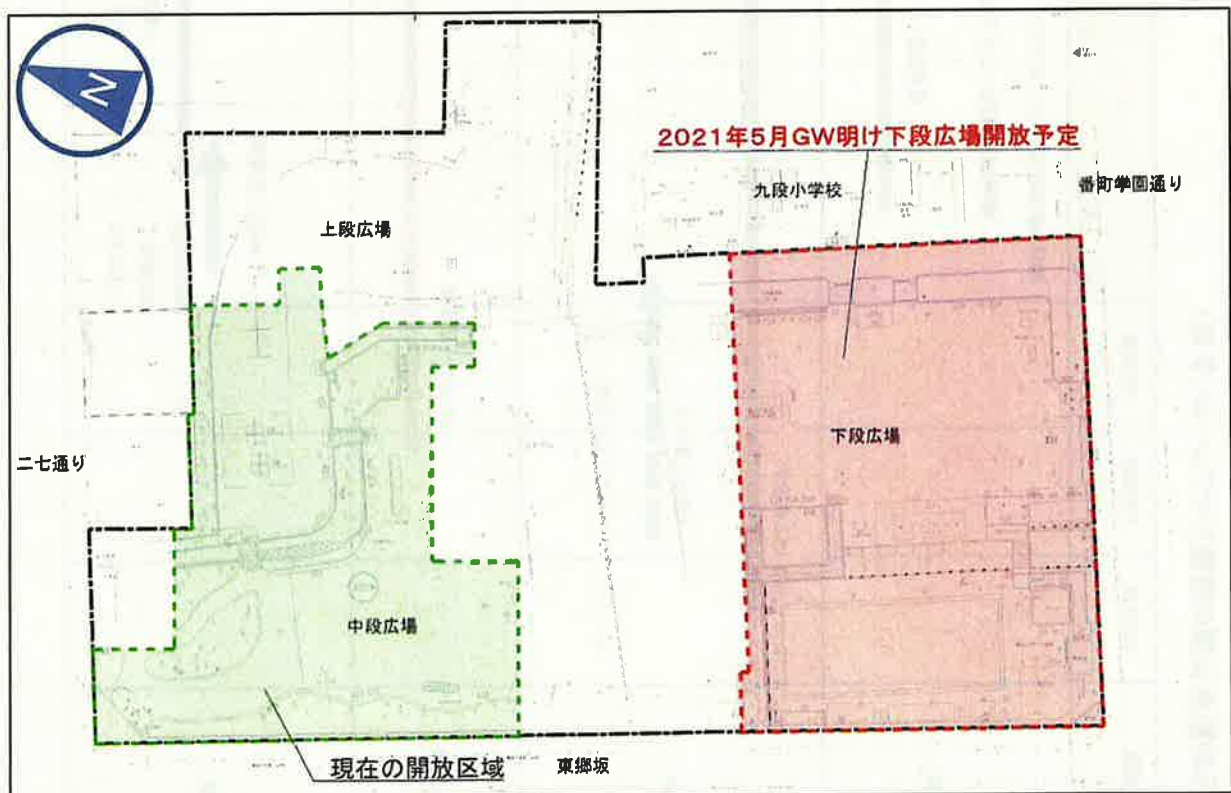

東郷元帥記念公園の整備スケジュール(予定)

項目	H29年度	H30年度	R元年度	4月	7月	10月	1月	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)
協議会 設計見直し				■第18回協議会 (5月上旬予定)	■第19回協議会 (5月下旬予定)	変更設計			
工事全体	・ H29.10工事着手	・ H30.5工事中止 ・ H30.7土壌調査							
上・中段広場			・ H31.3.25一部開放		一部開放			土壌対策・ 広場整備工事	
下段広場				・ 4/16工事再開 樹木の伐採・ 施設撤去 (1.5か月)	土壌対策工事 (5ヶ月)	広場整備工事 (6ヶ月)		下段広場開放	
