

東郷元帥記念公園の改修整備について

1 経過

東郷元帥記念公園改修工事は、平成29年10月に工事着手しましたが、公園区域内から国が定める土壌含有量基準を超える「鉛」が検出されたことにより、工事を一時中止し、「東郷元帥記念公園改修整備検討協議会」で土壌の処理や樹木の取扱いについて検討してまいりましたが、ある程度の整理がついたことから、令和2年4月16日に下段部の工事について再開いたしました。

今般、令和2年8月7日と9月8日に開催した「東郷元帥記念公園改修整備検討協議会」において、土壌対策や樹木の取扱いを含めた修正整備案について合意をいただいたことから、区として方針を決定しました。

2 主な変更

- ・デッキの縮小
- ・樹木の配置計画
- ・こどもの池形状変更

3 今後のスケジュール

- | | |
|--------------|----------------------|
| ・令和2年9月～12月 | 修正設計 |
| ・令和3年第1回定例議会 | 契約変更議案 |
| ・令和3年5月上旬 | 下段部の工事完了予定（開放） |
| | 下段部完了後 引き続き、上中段の工事開始 |
| ・令和4年3月末 | 上中段の工事完了予定 |

東郷元帥記念公園 修正案の検討

《現計画》

【コンセプト】

- 多様性の確保・使いこなしの継承
 - ・おいかけてこ、ラジオ体操、休憩など様々な使い方を許容する公園デザインとする。
 - ・座れる場所や木陰を確保する。
 - ・下段広場と中段広場をつなぐ坂を継承する。
- 周辺との連続性の確保
 - ・公園エントランスの設え、東郷坂の動線を補う公園園路の抽出により、周辺との連続性を確保する。
- 歴史の継承
 - ・帝都復興公園のシンメトリー性を継承する。
 - ・東郷元帥邸宅の面影（ライオン像、力石）など、歴史を感じさせるものを継承する。
 - ・大径木の保存とともに再配置による更新を図る。

《現計画の見直し》

【検討手順】

1. 保全樹木の確認
2. 樹木の保全方法の整理
3. 土壌汚染対策（封込対策）の検討
4. 伐採に伴う補植の検討
5. 第13～18回協議会・アンケート調査において頂いたご意見に対する対応方法等の整理

- 第13～18回協議会・アンケート調査において頂いたご意見
- ・樹木について
 - ・ドングリ、赤い実等、木の実を拾うなどができる樹木があると良い
 - ・紅葉、桜、広葉樹等、自然に親しめる、子供が楽しめる樹木があると良い
 - ・東郷坂沿いに防音のため、樹木を入れてほしい
 - ・カエルが生息する下・中段広場の間(斜面地)の緑地面積を確保して欲しい
 - ・樹木の管理のことを考えて植栽していただきたい
 - ・サクラをたくさん新植してほしい
 - ・出入口・公園内のエリア分けについて
 - ・上段広場は幼児、中段広場は小学生、下段広場はボール遊び等、未就学児と小学生のエリアを分けてほしい
 - ・場所や時間帯の規制、ネットフェンスで囲うなどをしてほしい
 - ・ゲート(扉)をつけて飛び出し防止をしてほしい
 - ・東郷坂の出入口前は交差点のため、急な飛び出しを防止してほしい
 - ・遊具・休憩施設について
 - ・鉄棒、ブランコ、すべり台、大型遊具等たくさん遊具が欲しい
 - ・遊具のそばや木陰等に十分な数のベンチがあると良い
 - ・上段広場のベンチの上にはひさしが欲しい
 - ・下段広場のウッドデッキ(休憩広場)について
 - ・広場は広く取ってほしいため、デッキ縮小または撤去をしてほしい
 - ・休める場所よりも遊べる場所が欲しい
 - ・屋根付きの遊べるスペースがあると良い
 - ・バリアフリールートを変更し、デッキを縮小する
 - ・安全面について
 - ・安全面にしつかり配慮してほしい
 - ・今後宴会や様々な遊びの場となる可能性が高いため、騒音と安全面に配慮してほしい

《修正事項》


東郷元帥記念公園 修正事項案
(第19回協議会での確認事項)

- 全体計画平面図
 - デッキの縮小 (500㎡⇒360㎡)
- 植栽計画
 - 樹木の配置
 - ・ サクラ類
 - 既存 5本 新植 10本
 - ・ ドングリのなる樹木
 - 既存 7本 新植 2本
 - ・ 実のなる樹木
 - 既存 0本 新植 2本

【修正案】



【原案】

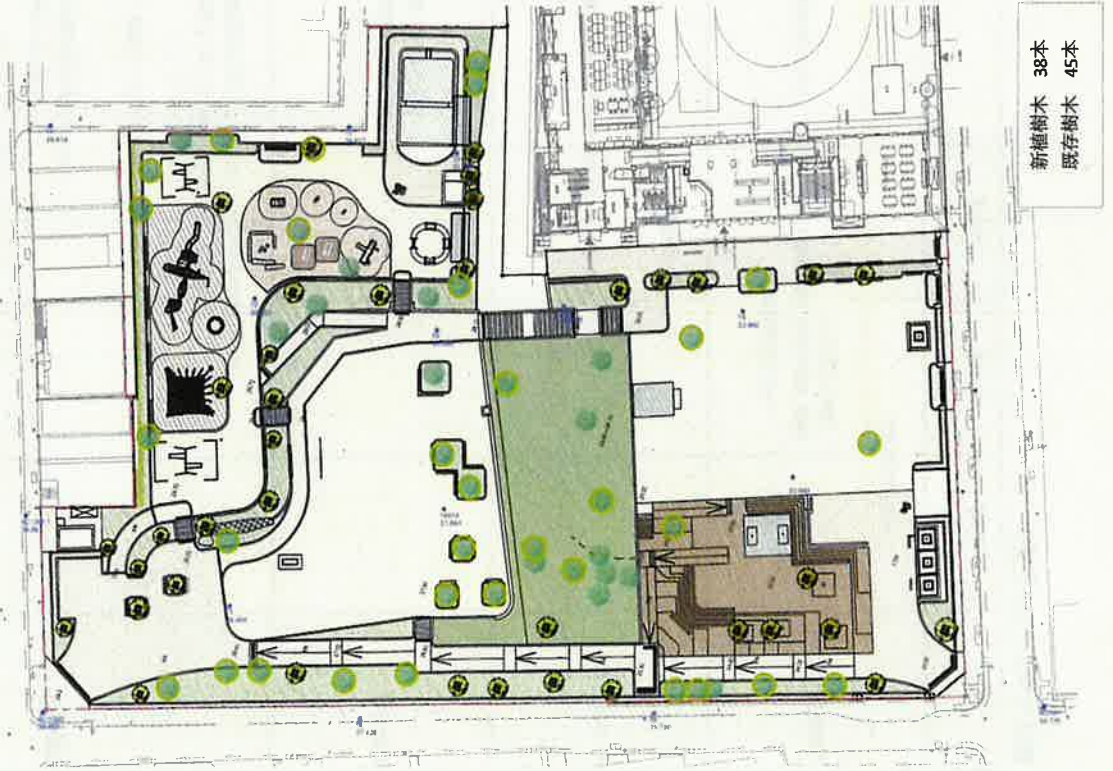

■スケジュール(予定)

項目	H29年度	H30年度	R元年度	4月	7月	10月	1月	令和3年度 (2021)	
工事全体	<ul style="list-style-type: none"> ・ H29.10工事着手 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H30.5工事中止 ・ H30.7土壌調査 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H31.3.25一部開放 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 4/16工事再開 					
上・中段広場						一部開放		土壌対策・ 広場整備工事	
下段広場				樹木の伐採・施設撤去	アスベスト除去	土壌対策工	広場整備工事	下段広場開放	
協議会等		<ul style="list-style-type: none"> ・ H30.8.7 (第14回協議会) ~ R元.10.29 (第16回協議会) 土壌処理と保全樹木の取扱いについて検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・ R元6月6月~12月アンケート調査 (小学生・保青園) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ R2.2.13 (第17回協議会) 土壌処理と保全樹木の取扱い方針決定 		<ul style="list-style-type: none"> ・ R2.8.7 (第18回協議会) デッキ細小案の検討 ・ R2.9.8 (第19回協議会) 変更計画の決定 			
