

東郷元帥記念公園の改修整備について

東郷元帥記念公園の改修にあたり、塀の一部からアスベストが検出されたため、アスベスト除去工事及び塀周辺の鉛の含有した土壌の処理を追加する。

1 請負者	富士・日産建設共同企業体	
2 工期	平成29年10月20日から令和4年3月31日	
3 契約金額	変更前	680,800,680円
	変更後	713,259,480円
	増額	32,458,800円

6億8000万円

先決2/1/2

4 変更内容	アスベスト除去工	一式
	鉛が含有した土壌処理	土量 49 m ³
		廃棄物 74 m ³

5 今後のスケジュール


令和2年6月中旬 東郷元帥記念公園改修整備検討協議会の委員に対するお知らせ

周辺地域へのPR

7月上旬	アスベスト除去工事開始 (1.5ヶ月)
8月中旬	下段部土壌対策工事開始 (3ヶ月)
11月中旬	下段部広場整備工事 (6ヶ月)


三層目の塗装はアスベスト撤去と土壌

■作業場断面

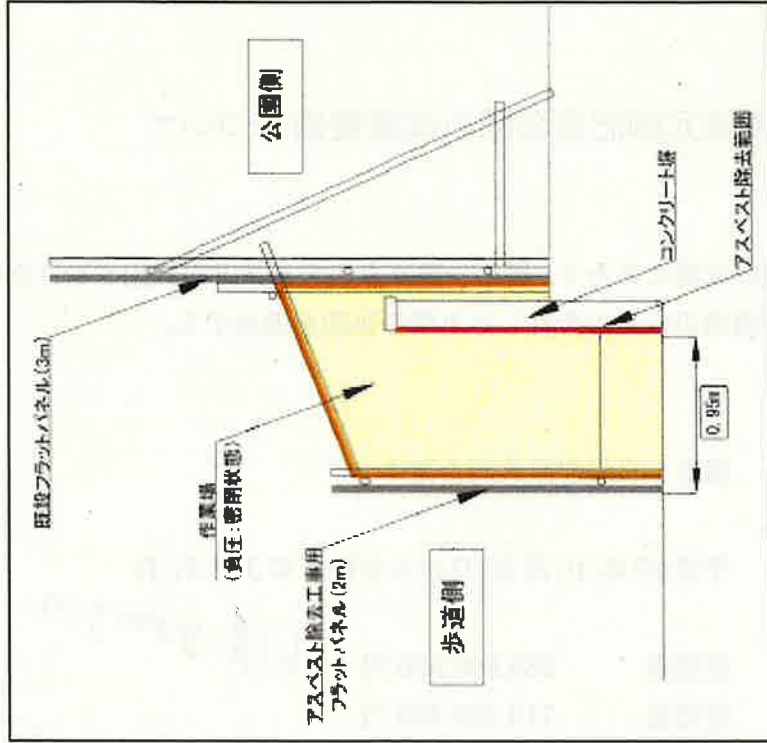

地味色でセーティング 2m

■アスベスト含有範囲・設備配置

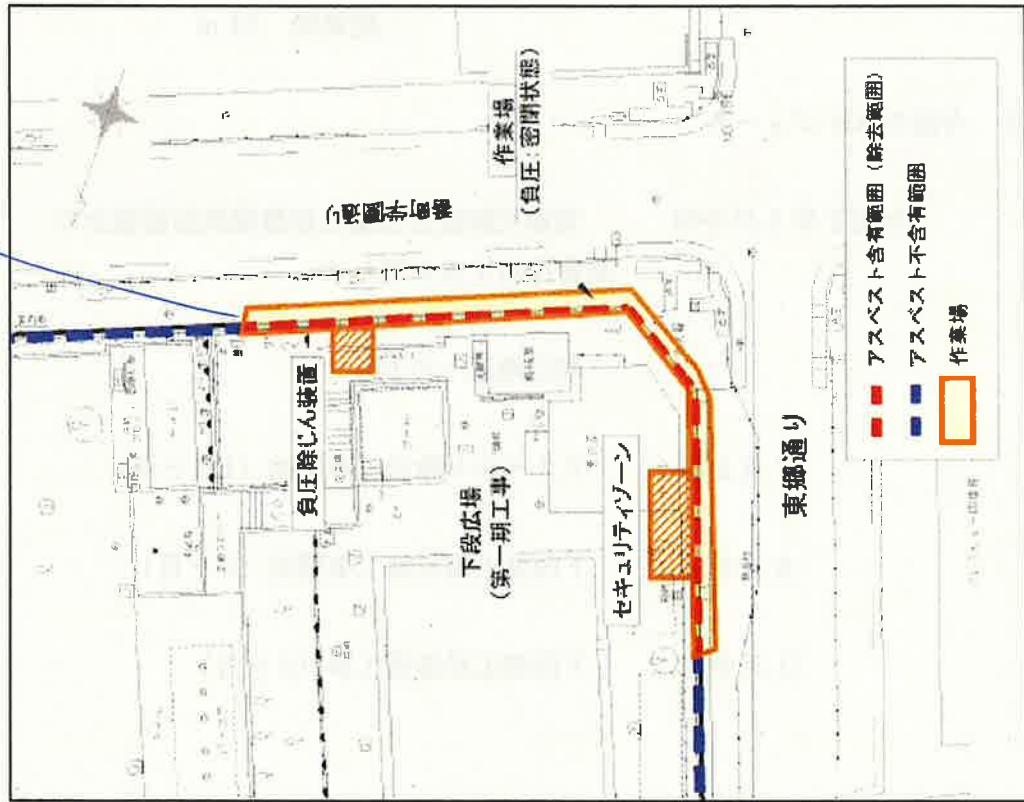

アスベスト撤去と土壌
全体見直しが必要

■スケジュール(予定)

項目	H29年度	H30年度	R元年度	4月	7月	10月	1月	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)
工事全体	・ H29.10工事着手	・ H30.5工事中止 ・ H30.7土壌調査		・ 4/16工事再開					
上・中段広場			・ H31.3.25一部開放			一部開放			土壌対策・ 広場整備工事
下段広場				樹木の伐採・施設撤去 (1.5か月)	アスベスト除去 (1.5か月)	土壌対策工 (3ヶ月)	広場整備工事 (6ヶ月)		下段広場開放

