

外濠公園総合グラウンド整備について

事業概要

外濠グラウンドは、区内の貴重な屋外スポーツ施設であるが、冬期休業やメンテナンス、及び雨天やその後のグラウンドコンディション不良などにより、年間で約150日使用出来ず、十分な活用が図られていない状況である。

そこで、グラウンドの通年利用を可能にし、区民がスポーツに親しめる環境を高めるための整備を行う。




【参考】グラウンドが使用できない日数

冬期休業	: 約90日
通常メンテナンス	: 約20日
天候不良	: 約30日
コンディション不良	: 約10日
合計	: 約150日

施設概要（外濠公園運動施設部）

- ・土地所有 国有地（財務省）
- ・位置 千代田区・新宿区の区境
- ・面積 20,222㎡（内グラウンド部 約7,000㎡）
内訳 千代田区：7,404㎡ 新宿区：12,818㎡
- ・文化財指定 国指定「史跡江戸城外堀跡」

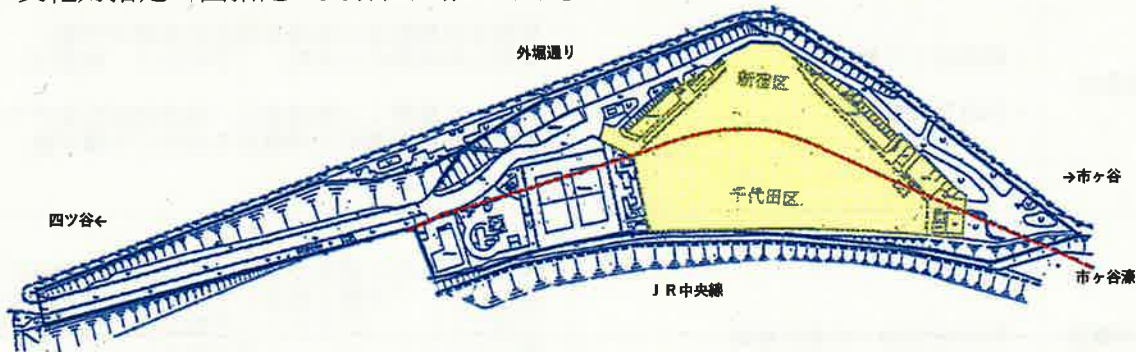

経緯

平成26年から議会よりグラウンドの人工芝生化を求められ、整備を検討してきたが、多岐にわたる課題により事業が進捗していない。

議会答弁

- ・平成26年4定（代表） 文化財保存の観点から、現状変更は難しく、慎重な対応が必要
- ・平成27年4定（代表） 区民の利便性の向上を図るべく、多目的利用の実現に向け協議を進める
- ・平成30年4定（代表） 様々な機関と協議、調整があり課題は山積だが、着実に整備に取り組む
- ・令和2年3定（決特） 人工芝生化を念頭に置きながら検討を進めている

事業経緯

- ・平成28年度 グラウンド整備検討・調査委託 → 執行
- ・平成29年度 グラウンド設計委託 → 関係機関協議に時間を要し未執行
- ・平成30年度 グラウンド設計委託 → 執行
- ・平成30年度 グラウンド整備工事 → 関係機関協議に時間を要し未執行
- ・令和元年度 グラウンド土壌調査 → 関係機関協議に時間を要し未執行
- ・令和2年度 グラウンド修正設計委託 → 執行

課題と解決の方向性

	項目	課題	解決への方向性
①	文化財の保存・活用	<ul style="list-style-type: none"> ・史跡江戸城外堀跡保存管理計画の見直し（外濠グラウンドの現状変更許可期限は2028年まで） ・「文化財保護法」及び「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正 	<ul style="list-style-type: none"> ・現在、外堀跡の歴史的・地理的な環境変遷について取りまとめを行っている。 ・今後、保存管理計画の見直しに関する関係区及び関係機関との調整を行う。 ・来年度以降保存活用計画策定委員会を立ち上げ進めていく。
②	地球温暖化対策	<ul style="list-style-type: none"> ・千代田区地球温暖化対策第4次実行計画、ヒートアイランド対策との整合性 	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒートアイランド対策として区有施設の緑化が挙げられている。 ・日中の表面温度の上昇をいかに抑えられるかが課題であり、表面温度を下げられる方法を検討中である。 <p>小坂 人工芝の 問題の 解決は あり ・区対区からの工事発注 ・工事内容の答へられる</p>
③	土壌汚染対策	<ul style="list-style-type: none"> ・土壌汚染対策法に係る手続き ・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例等に係る手続き ・土壌調査 	<ul style="list-style-type: none"> ・極力、土壌概況調査を要しない方向で検討を進める。
④	費用負担	<ul style="list-style-type: none"> ・新宿区との協議 ・助成金の整理 	<ul style="list-style-type: none"> ・新宿区は補助金の活用を条件に負担が可能。負担は利用割合と同等。（千代田7：新宿3） ・スポーツ振興くじ助成金は、現在助成を受けている天然芝の財産処分手続きを条件に申請可能。
⑤	利用者調査	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者団体への意見聴取 	<ul style="list-style-type: none"> ・区に寄せられた意見では、「多目的に利用させてほしい」、「冬期も開放して利用可能日を増やしてほしい」、「グラウンド状態が良くないので整備してほしい」といった声が寄せられた。 ・3月のグラウンド活用を試験的に実施予定

今後の予定

- ・令和3年4月～ 改修工事实施設計
- ・令和3年7月～ 新宿区予算要求協議 令和4年度予算要求（工事費）
- ・令和3年9月～ 関係機関調整（関東財務局、文化庁、東京都環境局、スポーツ連盟）
- ・令和3年11月迄 助成金申請（日本スポーツ振興センター）
- ・令和3年12月～ 設計図書作成
- ・令和4年1月～ 契約準備（令和4年2定議案提出予定）
