

明大通りⅡ期歩道拡幅工事請負契約について

1 工事場所

千代田区神田神保町一丁目41番地先～神田駿河台二丁目1番地先

2 工事概要

【施工概要】

夜間施工

路線名 特別区道千第101号(明大通り)

施工延長 570.8m

【内容】

車道舗装、歩道舗装、街きょ工、植樹ます設置工、街路灯建替等

3 工事期間

契約締結日の翌日から令和5年5月31日まで

4 入札結果 (10月26日開札)

業者名	入札金額 (消費税含む)	結果
大林道路株式会社	339,900,000	落札
東京舗装工業株式会社	346,500,000	
常盤工業株式会社	350,900,000	

予定価格 (税込) 408,996,500円

5 入札参加資格 裏面のとおり

6 契約方法

制限を付した一般競争入札による契約 (2者JVまたは単体事業者)

7 契約内容

(1) 契約金額 339,900,000円

3億4千万円

(2) 契約の相手方


東京都千代田区神田猿楽町二丁目8番8号


大林道路株式会社

代表取締役 黒川 修治

入札参加資格要件

1	<p>この入札に参加できる者は、2者構成の建設共同企業体または単体事業者。東京電子自治体共同運営電子調達サービス（以下「電子調達サービスという」）に登録が必要。 登録業種は「01 道路舗装工事」であること。</p> <p>2者構成の場合 （第一順位の構成員） （1）本店又は支店等が千代田区又は近隣区（中央区、港区、新宿区、文京区、台東区）内にあり、電子調達サービスの共同格付がA格 （2）過去5年度間に、元請で道路舗装工事の実績（契約金額2億8千万円以上）を1件以上有する （3）建設共同企業体出資割合は、50%を下回らない （第二順位の構成員） （1）本店又は支店等が千代田区内にあり、電子調達サービスの共同格付がA格、B格、C格 （2）建設共同企業体出資割合は、30%を下回らない</p> <p>単体事業者の場合 （1）本店又は支店等が千代田区内にあり、電子調達サービスの共同格付がA格 （2）過去5年度間に、元請で道路舗装工事の実績（契約金額2億8千万円以上）を1件以上有する</p>
2	<p>地方自治法施行令第167条の4の規定（不正な入札行為など）に該当しないこと。</p>
3	<p>会社設立後、引き続き2年以上その業務を行っていること。</p>
4	<p>経営不振の状態（自己資本マイナスを含む）にないこと。</p>
5	<p>建設業法で規定する専任の技術者を適正に配置できること。</p>
6	<p>千代田区において指名停止期間中でなく、指名停止事由に該当する恐れのないこと。 千代田区契約関係暴力団等排除要綱に基づく入札参加除外期間中でないこと。</p>
7	<p>建設業法第3条に基づく特定建設業の許可を受けていること。</p>

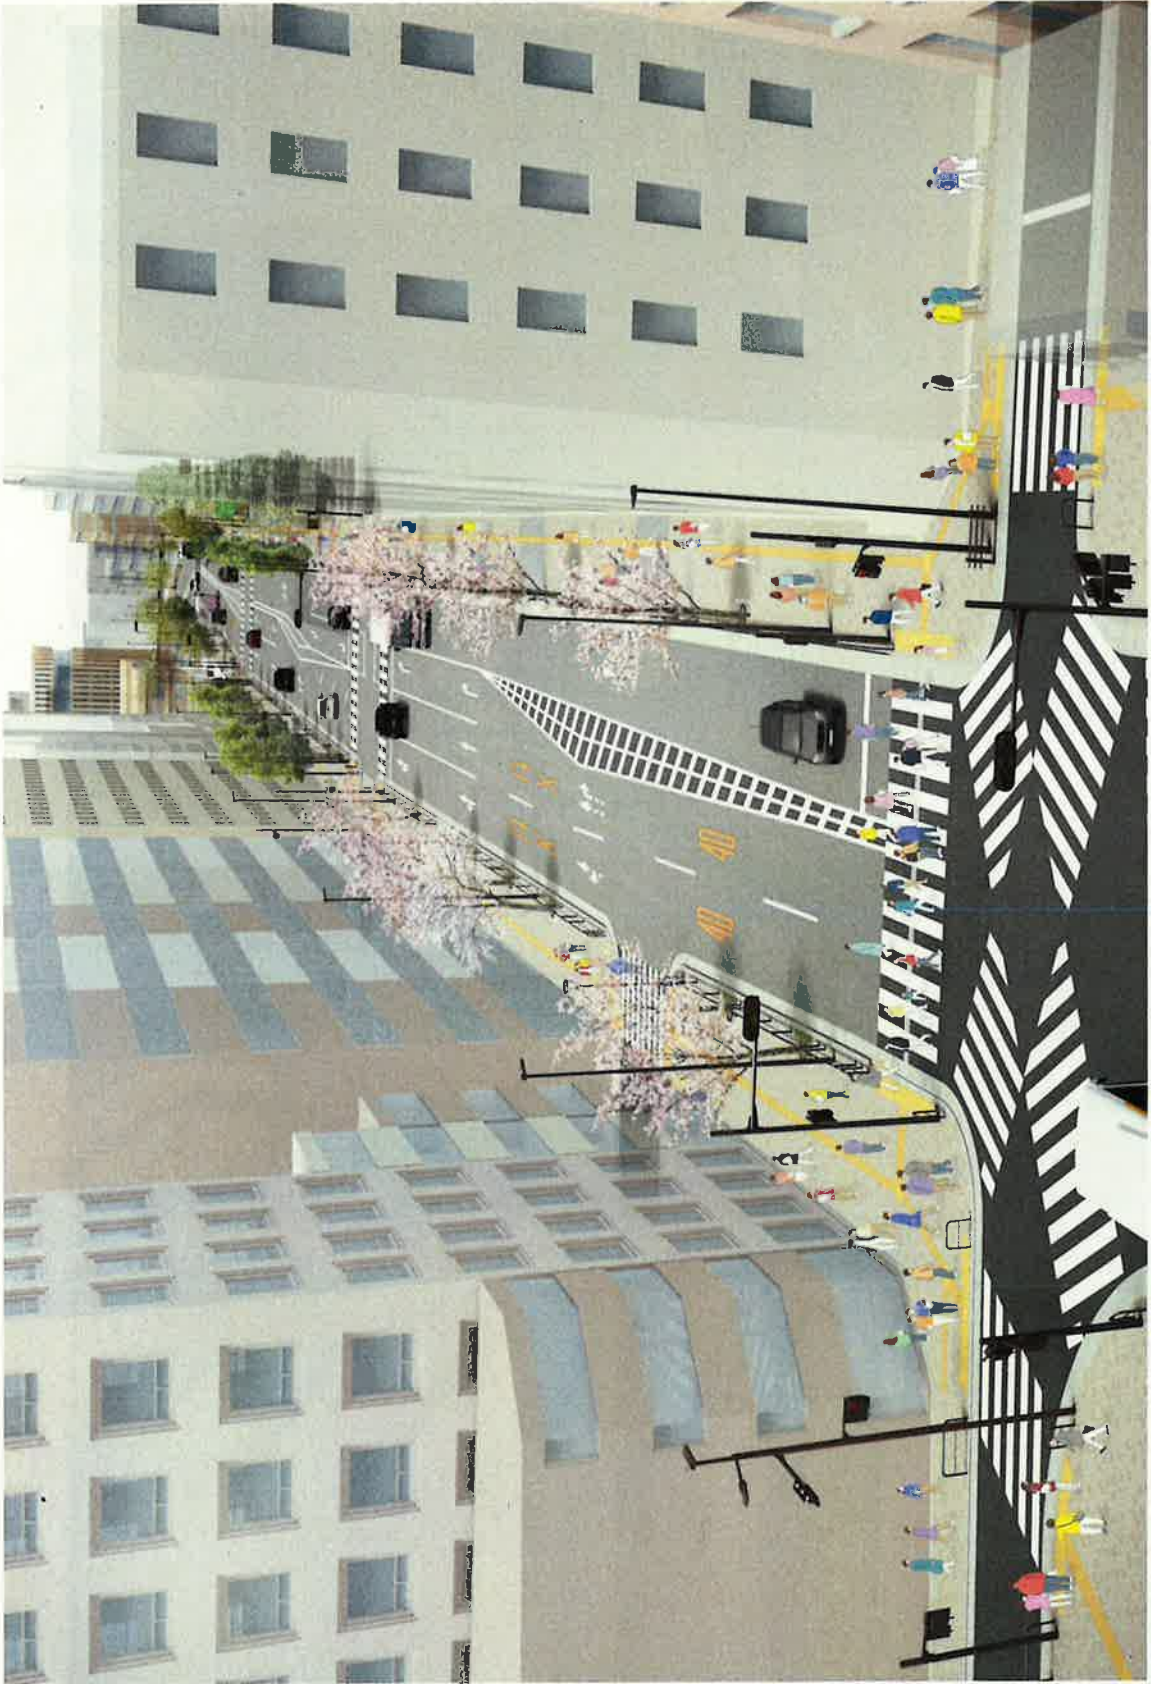

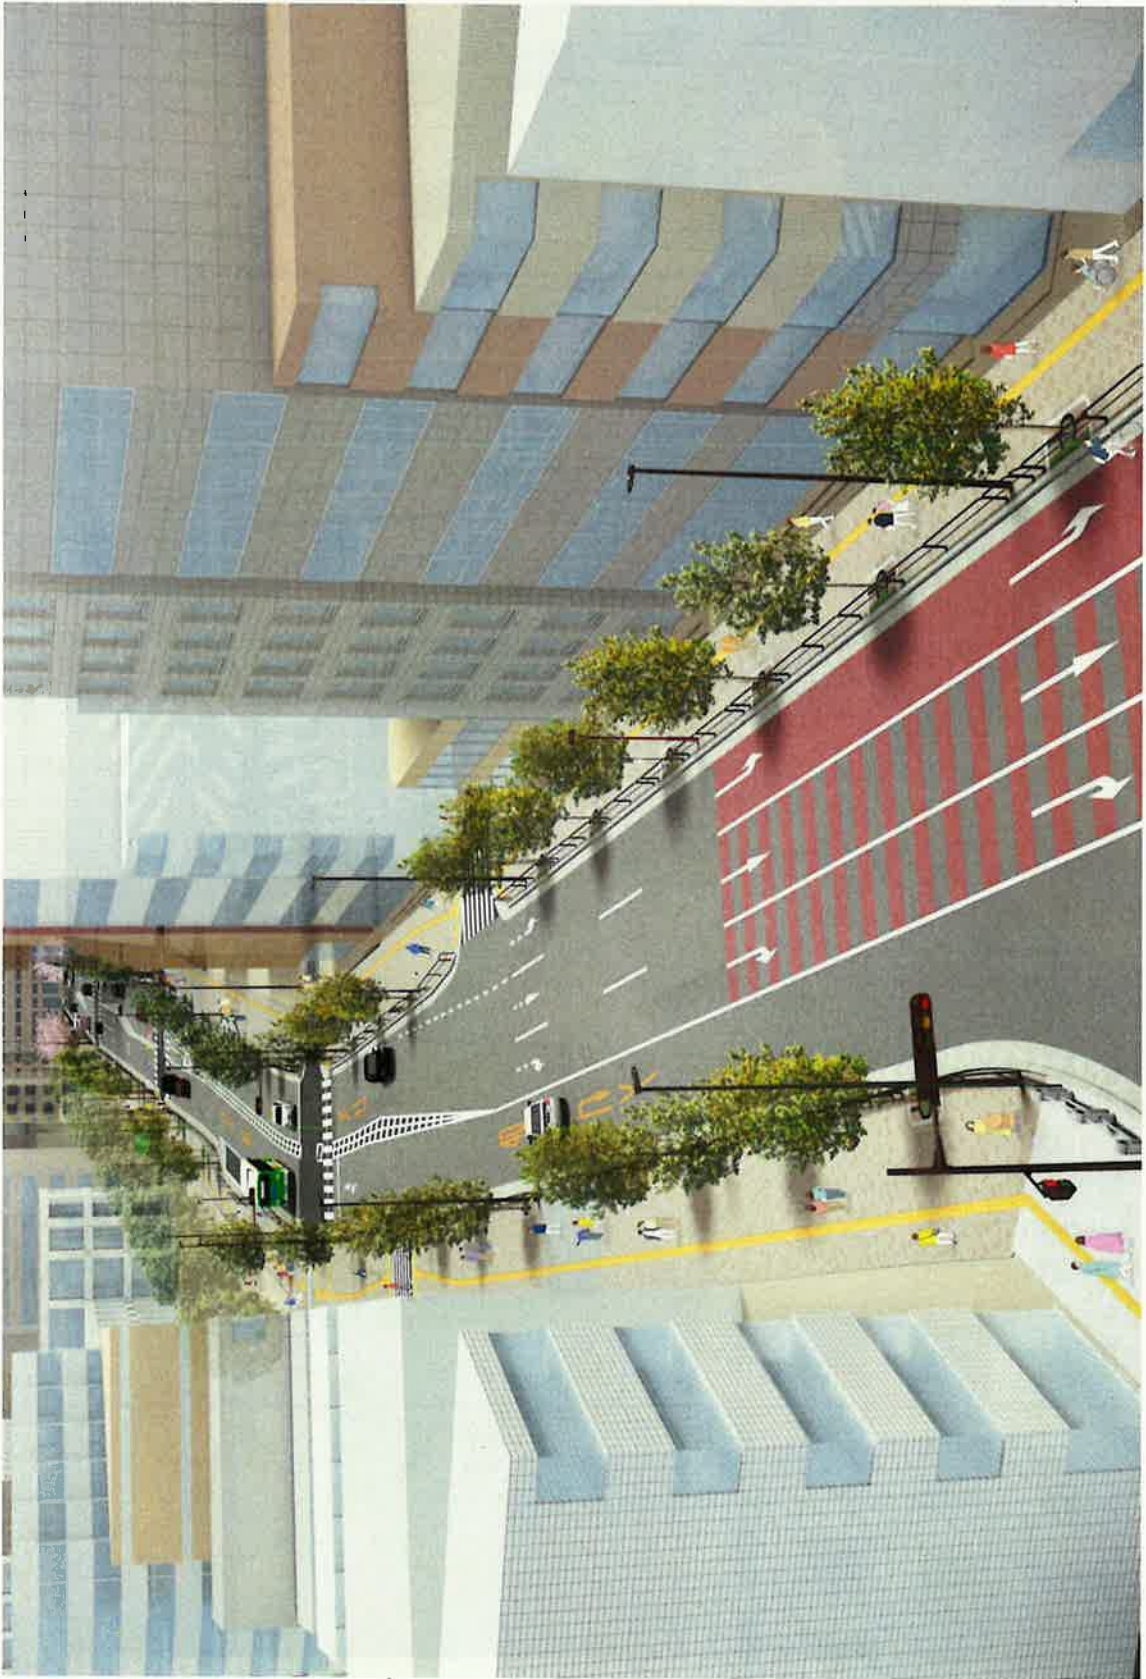








明大通りⅡ期歩道拡幅工事（第16号）について

1. 工事場所

千代田区神田神保町一丁目41番地先～神田駿河台二丁目1番地先（明大通り）

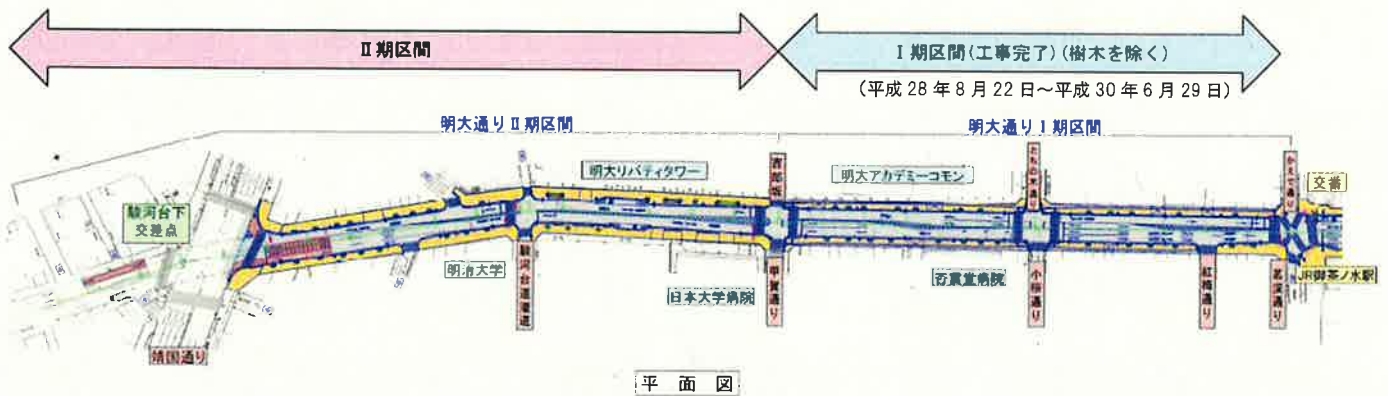

2. 工事概要

本工事は、誰もが安全かつ快適に移動することができるよう、歩道を拡幅し、セミフラット方式による段差解消等のバリアフリー化と併せて、保水性カラー舗装化及び遮熱性舗装化並びにLED照明灯への転換等の環境に配慮した道路整備を行うものである。

施工延長：L=570.8m

作業時間：夜間施工

主な工事内容：Ⅱ期工事部	①歩道の拡幅及び段差改良	1式
	②歩道の保水性舗装	1,620㎡
	③車道の遮熱性舗装	2,102㎡
	④街路灯のLED化	23基
	⑤街路樹の移植（Ⅰ、Ⅱ期）	40本
	⑥ガードパイプ設置工	359.1m
Ⅰ期工事部	①ガードパイプ移設工	319.2m
	②街路樹柵改良工	41箇所
	③街路樹の新設	10本

3. 工事スケジュール（予定）

契約締結日の翌日～令和5年5月31日まで


年月	R3年度				R4年度				R5年度	
	6月	9月	12月	3月	6月	9月	12月	3月	6月	
明大通りⅡ期工事				準備工	工事予定期間					

街路樹の計画方針及び計画内容

計画方針

- ① 既存プラタナスは、出来るだけ明大通り内へ移植・保全を行なう。
- ② Ⅰ期工事で移植し、苗圃で樹勢回復したプラタナスを再活用する。
- ③ 専門家の助言のもと、1本1本の樹勢や将来的な樹形を確認した上で移植の可否を決定する。
- ④ 花の咲く樹木を新植する区間を設ける。
- ⑤ 明大通りを以下4つのゾーンに分けて整備を行う。
- ⑥ 既設の低木（オオムラサキツツジ）の再利用を行う。

全体平面図

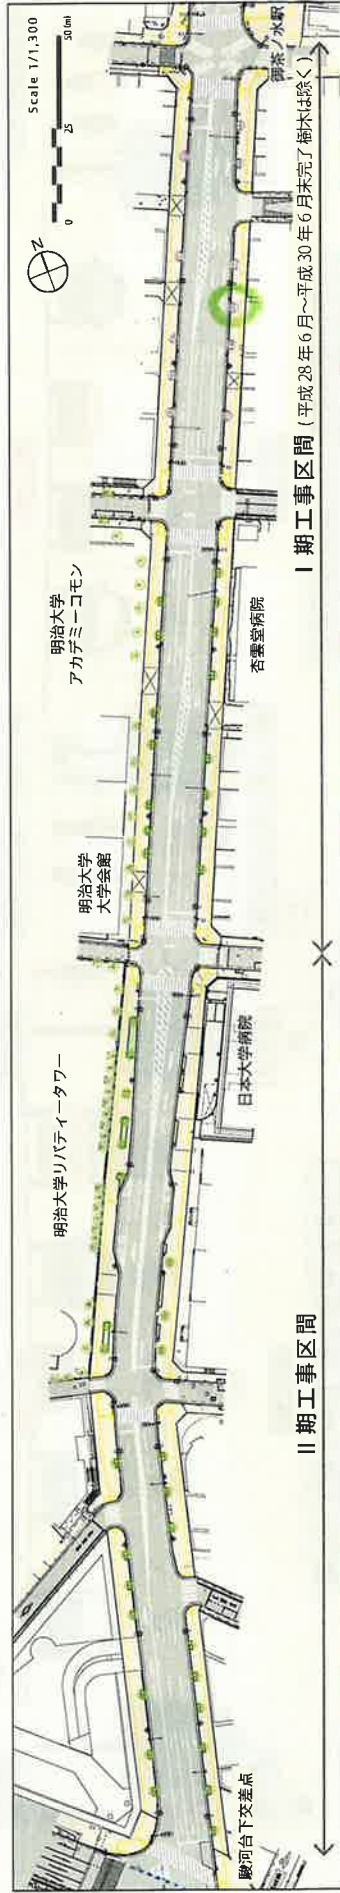

Ⅱ期工事①区間

Ⅰ 既存のプラタナスを車道側植樹ますへ移植し保全する区間。

Ⅱ期工事②区間

Ⅰ 公開空地の通行を前提に、既存のプラタナスを保全する区間。

Ⅰ期工事①区間

Ⅰ 既存及び苗圃のプラタナスを移植し保全する区間。

Ⅰ期工事②区間

Ⅰ 花の咲く樹木(桜)を植える区間。

一葉桜を主体とし、樹形が道路構造に適合した駿河台句を1本植える。




サトザクラの代表的な品種。江戸時代以前からあり、新宿御苑にもある代表的な桜。
4月中旬から下旬にかけて開花する。



オオシマザクラ系の品種。江戸時代駿河台の武家屋敷に植えられていた桜。香りが強いことから命名された。
4月下旬から5月上旬に開花する。

計画平面・断面図(明大通りⅡ期)

明大通りⅡ期 L=350m

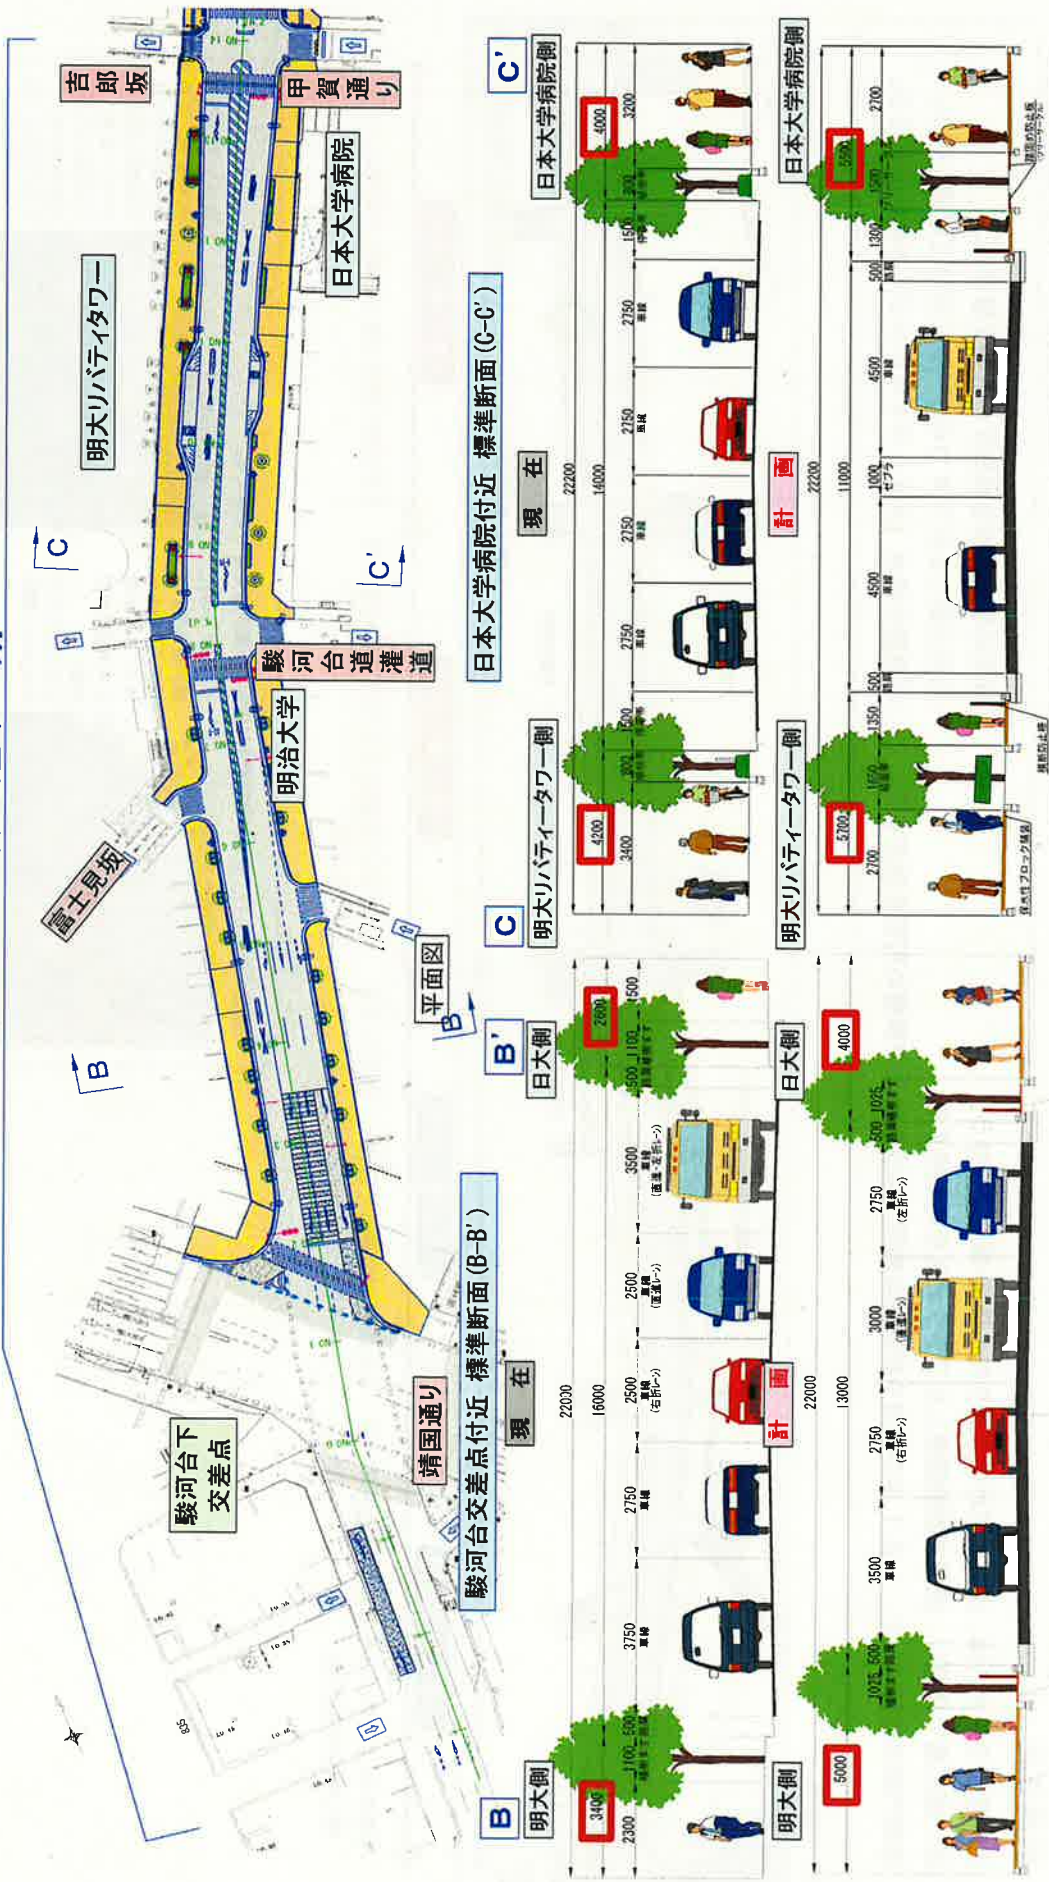


●歩道幅員: 約4.2m - 約5.7m (明大リハビリタワー側), 約4.0m - 約5.7m (日本大学病院側)


●歩道幅員: 約3.4m - 約5.0m (明大側), 約2.6m - 約4.0m (日大側)

計画平面・断面図(明大通り I 期)

明大通り I 期 L=265m

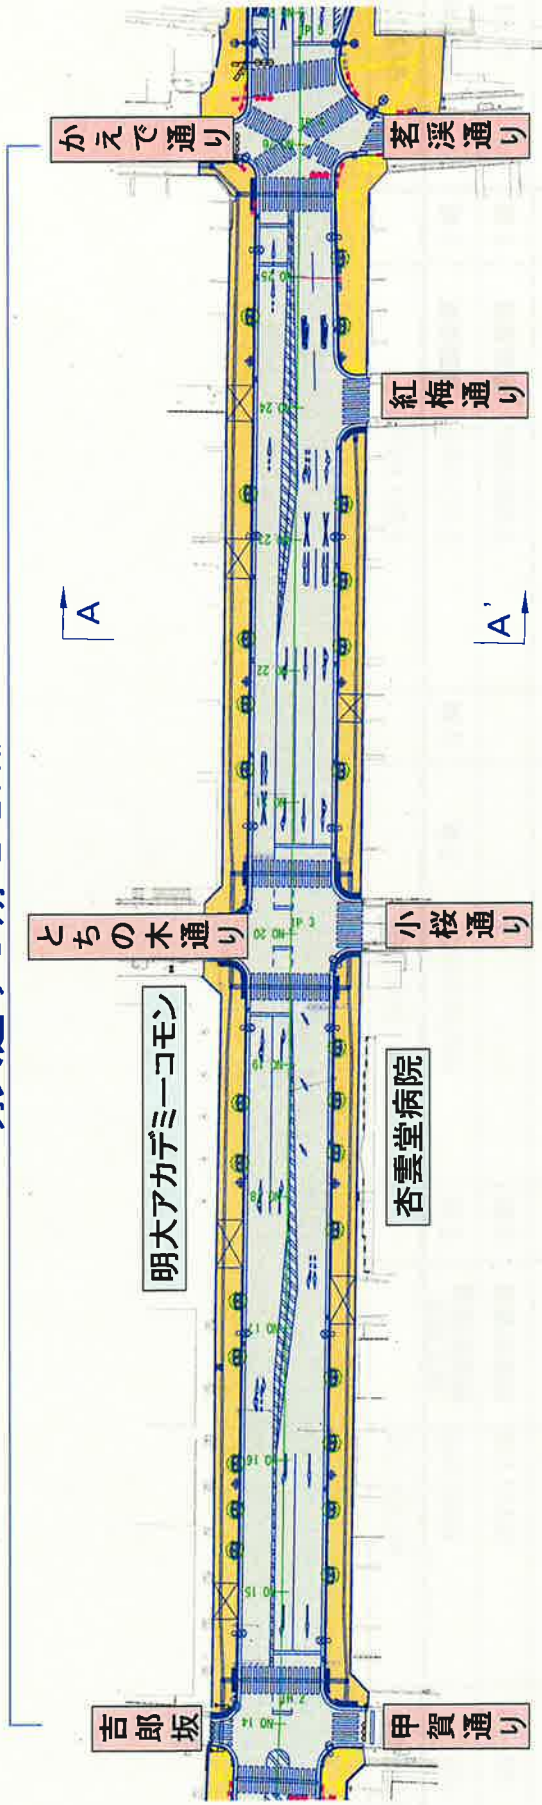

杏雲堂病院付近 標準断面 (A-A')

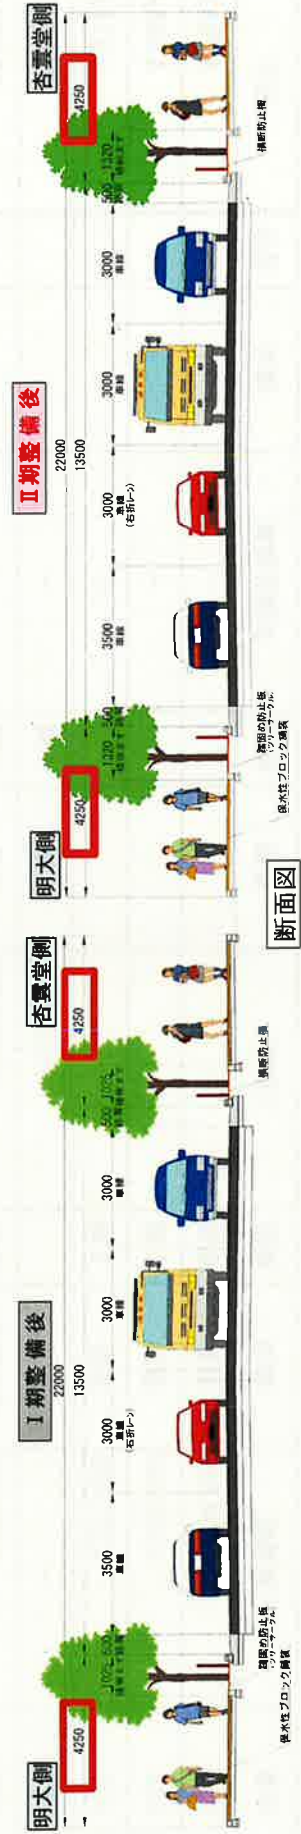

●歩道幅員約 4.25m (約 0.25m 拡幅済み)

明大通り拡幅工事 年度別財源一覧表(H25年度～R3年度)

年度	設計業務費	種別	範囲	工事費	種別	範囲	工事費	種別	範囲	苗圃管理費	種別	区分	合計
H25	4,704,000	測量	全体	-			-			-			4,704,000
H26	4,555,440	設計	I期	-			-			-			4,555,440
H27	4,271,400	設計	II期	-			-			-			4,271,400
H28	-			78,500,000	工事	I期				-			78,500,000
H29	4,968,000	修正設計	全体	90,954,000	工事	I期				-			95,922,000
H30	4,553,280	協議会準備費	II期	78,515,080	工事	I期				2,132,460	管理委託	I期	85,200,820
R1	6,941,000	協議会運営	II期	-						2,147,057	管理委託	I期	9,088,057
R2	9,417,100	協議会運営	II期	-						2,200,000	管理委託	I期	11,617,100
R3	6,897,900	協議会運営 修正設計	II期	339,900,000	工事	II期				2,171,950	管理委託	I期	348,969,850
合計金額	46,308,120			587,869,080						8,651,467			642,828,667
